

# Tableau de bord pour le portefeuille:

# « Intitulé du portefeuille ici »

Choisir un portefeuille: Plan stratégique

Schéma directeur SI

Projets 2022 2025

% achevé (pondéré) du X % portefeuille:

Nombre de programmes

X Programmes

#### Charge de travail du portefeuille (en heure (h)):

Charge planifiée
Χh

Charge Réelle Υh

Glissement de la charge Y-X h

#### Coût du portefeuille (en Dinars (DT)):

Cout planifié
X DT

Cout Réel Y DT

Glissement de cout Y-X DT

## Durée du portefeuille (en jours/ou en mois (à précisier):


Durée planifiée
ΧΊ

Durée Réelle ΥJ

Glissement de la durée Y-X J

Intitulé du programme	% achevé (pondéré)
Retail	X %
Programme TPME	Y %
BFI	Z %
M	M

## % achevé (pondéré) des programmes

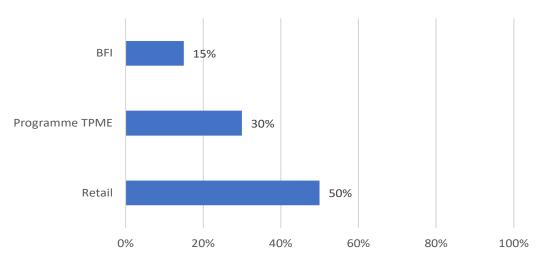



# Tableau de bord pour le Programme:

# « Intitulé du programme ici »

Choisir un portefeuille: Plan stratégique

Schéma directeur SI

Projets 2022 2025

% achevé (pondéré) du programme:

X %

Nombre de projets

X Projets

Choisir un Programme: BFI

Programme TPME

Retail

#### Charge de travail du programme (en heure (h)):

Charge planifiée

Χh

Υh

Charge Réelle

Glissement de la charge

Y-X h

Intitulé des projets	% achevé (pondéré)
Projet #01 : Instaurer une approche d'intensification basée sur la valeur	X %
Projet #02 : Optimiser l'organisation commerciale et des outils BFI	Y %
Projet #03 : Sécurisation des activités marché	Z %

#### Coût du programme (en Dinars (DT)):

Cout planifié X DT

Cout Réel Y DT

Glissement de cout Y-X DT

# Durée du programme (en jours/ou en mois (à précisier):

Durée planifiée ΧJ

Durée Réelle ΥJ

Glissement de la durée Y-X J

% achevé	(ро	ndér	é) de	es pro	jets		
Projet #03 : Sécurisation des activités marché						43%	
Projet #02 : Optimiser l'organisation commerciale et des outils BFI							61%
Projet #01 : Instaurer une approche d'intensification basée sur la valeur							55%
	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60% 70%



# Tableau de bord pour le Projet:

# « Intitulé du Projet ici »

Nombre de chantiers

Intitulé des chantiers

Chantier #01: Optimisation de la

synergie Trade et Change

Chantier #02 : Cadrage de

commerciaux BTA

l'appétence et des objectifs

Chantier #03 : Poursuite du

développement de l'offre en lien

avec l'évolution réglementaire

Choisir un portefeuille: Plan stratégique

Schéma directeur SI

Projets 2022 2025

Choisir un Programme: BFI

Choisir un Projet:

Programme TPME

Retail

Projet #01: Instaurer une approche d'intensification basée sur la valeur

Projet #02 : Optimiser l'organisation commerciale et des outils BFI

Projet #03 : Sécurisation des activités

marché

% achevé (pondéré) du projet: X %

Phase à date du projet:

Recette

## Charge de travail du projet (en heure (h)):

Charge planifiée Χh

Charge Réelle

Υh

Glissement de la charge

Y-X h

## Coût du projet (en Dinars (DT)):

Cout planifié X DT

Cout Réel

Y DT


Glissement de cout Y-X DT

# Durée du projet (en jours/ou en mois (à précisier):

Durée planifiée ΧJ

Durée Réelle ΥJ

Glissement de la durée Y-X J

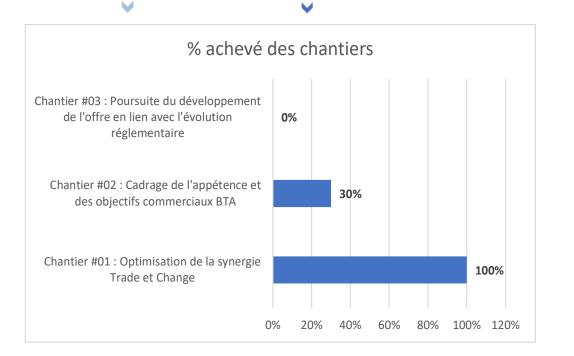

**X** Chantiers

% achevé

X %

Y %

Z %
